projEKTANT arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna
arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

**Obiekt:**

PROJEKT BUDOWLANY

# Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych w Moszczenicy, przy ul.Dworcowej, na działkach 640/25 i 640/38

**Inwestor:**

**Gmina Moszczenica**
**ul.Kosowska 1**
**97-310 Moszczenica**

**Główny projektant:**

Nazwa i adres:
**Ewa Katarasińska – Projektant S.C.**
**97-300 Piotrków Tryb. ul. Sienkiewicza 24 m.31**

Podpis: Kalo1

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski
AB-I.6741.29.2015.ZK
Załącznik do decyzji Nr 92/IV/2015
z dnia 27.05.2015 r.

Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Oświadczenie
3. Kopia uprawnień projektanta
4. Kopia wpisu do izby branżowej
5. Opis techniczny do projektu rozbiórki
6. Szkic lokalizacyjny

projEKTANT arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna
arch. arch. Ewa Katarasińska,
Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy „Prawo Budowlane" oświadczam, że projekt rozbiórek budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych w Moszczenicy, przy ul. Dworcowej, na działkach 640/25 i 640/38 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

EWA KATARASIŃSKA
Architekt
upr. proj. UAN.IV.7342/53/91
w spec. arch. bez ograniczeń
ŁOIA LO 0100

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Piotrków Tryb., dnia 18 .VI. 91

(pieczęć)

Nr UAN.IV.7342(53)91

# DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
## do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.1 i 2,7 i § 13 ust. 1 pkt 1 lit

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel (ka) Ewa Mieczysława Katarasińska
(imię i nazwisko)
magister inżynier architekt
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 1 stycznia 19 56 r. w Piotrkowie Tryb.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 piśm. 71g

Obywatel (ka) Ewa Mieczysława Katarasińska
(imię i nazwisko)
jest upoważniony (a) do:

1) sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
   a) architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
   b) konstrukcyjno - budowlanych obiektów budowlanych w budow-nictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2) w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.




ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
EWA KATARASIŃSKA
Architekt
upr. proj. UA... 7342/53/91
w spec. arch. bez ograniczeń
ŁOIA ŁÓ ...

m. p.

(podpis i pieczęć)

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

# ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

**(wypis z listy architektów)**

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Ewa Mieczysława Katarasińska**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **UAN.IV.7342(53)91**, jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LO-0100.**

Członek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-04-2015 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2016 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Wojciech Buczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**LO-0100-CC44-7YAY-11B5-YY83**

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
EWA KATARASIŃSKA
Architekt
upr. proj. UAN.IV.7342/53/91
w spec. arch. bez ograniczeń
ŁOIA LO 0100

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
Tuwima 7
97-300 Piotrków Trybunalski

projEKTANT arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna
arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

# OPIS PROJEKTU ROZBIÓREK BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYH PO BYŁYCH ZAKŁADACH BAWEŁNIANYCH W MOSZCZENICY PRZY UL. DWORCOWEJ dz. nr 640/25 i 640/38

## 1. Opis zagospodarowania terenu i stanu technicznego budynków

Na terenie nieruchomości znajdują się opuszczone, niezdatne do dalszego użytkowania budynki oraz pozostałości po budynkach w postaci fragmentów murów budynków z fragmentami dachu Opis budynków przedstawiono na rysunku nr 2. Budynki przeznaczone do rozbiórki stanowią zabudowę głównie jednokondygnacyjną bez podpiwniczenia, jedynie dwa budynki, pełniące kiedyś funkcje biurowe są dwukondygnacyjne, w tym jeden z nich podpiwniczony. 4 budynki są obiektami niezależnymi, natomiast pozostałe obiekty stanowią zwartą zabudowę. W zwartej zabudowie poprzemysłowej znajduje się komin o wys. ok 45 m W chwili obecnej żaden z budynków nie pełni jakiejkolwiek funkcji użytkowej. Budynki nie posiadają żadnych przyłączonych działających instalacji. Na działkach znajdują się niedziałające instalacje podziemne – kanalizacja, wodociąg, oraz nadziemne sieci energetyczne.

Powierzchnia zabudowy łącznie – 17.312,00 $m^2$

## 2. Zagospodarowanie terenu przy wykonywaniu prac rozbiórkowych:

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy:

1. Ogrodzić teren prowadzenia prac z niezbędnym terenem pomocniczym- wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,5 m.
2. W obrębie ogrodzenia wyznaczyć plac do składowania materiału rozbiórkowego
3. Wjazd na teren rozbiórki zorganizować z nieruchomości nr 640/15
4. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie odkryte studnie kanalizacyjne i włazy instalacyjne.

projEKTANT arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna
arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

### 3. Kolejność wykonywania robót

1. W pierwszej fazie rozbiórek teren należy oczyścić z zalegających śmieci i gruzowisk, przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na zły stan obiektów.
2. Demontaż dachów należy przeprowadzić przy użyciu dźwigu. Rozbiórkę należy rozpocząć od góry zdejmując istniejące poszycie, a następnie zdemontować przy pomocy elektronarzędzi i palników acetylenowo – tlenowymi konstrukcję dachu. Po demontażu konstrukcji należy przystąpić do usuwania elementów murowanych ścian. Rozbiórkę rozpocząć od góry zdejmując poszczególne elementy konstrukcyjne i usuwając urobek. Po wyburzeniu budynków teren należy oczyścić z pozostałości elementów konstrukcyjnych oraz śmieci. Należy zabezpieczyć i oznakować ewentualne otwory występujące na terenie
3. Prace rozbiórkowe murowanego komina rozpocząć od góry z podestu żurawia budowlanego, w sposób umożliwiający prowadzenie prac bez zbędnego narażania pracowników .
4. Równomiernie - od góry rozbierać poszczególne warstwy.
5. Materiał z rozbiórek zrzucać za pomocą rękawa na teren własnej nieruchomości
6. Śmieci na terenie budowy będą segregowane:

- gruz zostanie wywieziony samochodem - wywrotką i poddany utylizacji w kruszon, bądź wywieziony na przeznaczone do tego celu wysypisko spełniające wymogi ochrony środowiska

śmieci zostaną wywiezione na wysypisko spełniające wymogi ochrony środowiska (należy przedstawić świadectwo utylizacji śmieci)

7. Gruz oraz śmieci, do czasu wywozu, będą gromadzone w wyznaczonym do tego celu pojemnikach. Teren uprzątnąć

**Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej**

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

projEKTANT arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna
arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

## 4. Wskazanie zagrożeń i wymagań podczas rozbiórki - wytyczne do planu bioz:

- znaczne zagrożenia robót do pełnej wysokości budynków przy nie zachowaniu odpowiedniej bezpiecznej odległości od urządzeń wyburzających, ze względu na trudno przewidywalny promień spadania kruszonych elementów oraz odłamków gruzu od usuwanych stropodachów, ścian i konstrukcji drewnianej, konstrukcji stalowej dachu, części dachów oraz ich pokrycia.
- poważnym zagrożeniem dla ludzi jest wejście na gruzowisko dla usunięcia zburzonego materiału
-Szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią roboty budowlane wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznych
-Cały plac budowy poszczególnych etapów będzie ogrodzony, na ogrodzeniu znajdywać się będą plansze ostrzegawcze koloru żółtego z napisem „**TEREN BUDOWY WSTĘP SUROWO WZBRONIONY**”
-Na obrzeżach strefy pracy urządzenia wyburzającego oraz na obrzeżach strefy zagrożenia spadającym materiałem wyburzeniowym ustawione będą żółte plansze ostrzegawcze z napisem **„PRACE WYBURZENIOWE – WSTĘP WZBRONIONY”**
-Teren zagrożenia będzie otoczony taśmą koloru biało-czerwonego. Teren pracy kruszarki będzie oznaczony tablicami ostrzegawczymi o zakazie wstępu osób nie upoważnionych.
Tablica informacyjna budowy.
Na terenie budowy zapewniony będzie całodobowy nadzór.
-Przy pracach rozbiórkowych należy używać elektronarzędzi w klasie II o nieuszkodzonej izolacji, sprzęt budowlany, który będzie używany do prac rozbiórkowych powinien posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia sprzętu do eksploatacji – ważne badania techniczne. Pracowników wykonujących prace rozbiórkowe należy wyposażyć w odpowiednie ubranie robocze i sprzęt ochrony

projEKTANT arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna
arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

osobistej. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie zarówno BHP i PPOŻ, np. przy odcinaniu gazowym zwałów konstrukcyjnych.

-Prace na wysokościach mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie, posiadający ważne badania wysokościowe i powinni być wyposażeni w sprawny sprzęt ochraniający przed upadkiem z wysokości – dotyczy prac np. w koszu wysięgnika. Należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą strefę niebezpieczną oraz ustawić tablicę ostrzegawcze.

-Uwzględniając projektowany zakres robót przewidywana jest praca następującego sprzętu: liny i łańcuchy stalowe, podnośnik koszowy na żurawiu budowlanym, spycharka, ciągnik, palniki acetylenowo-tlenowe, szlifierki kątowe, ładowarko koparka. Strefa pracy sprzętu budowlanego powinna być oznakowana. Jest niedopuszczalne by pracownicy znajdowali się pod zwisającymi i pod podnoszonymi elementami konstrukcyjnymi – żelbetowymi lub pod demontowanymi elementami konstrukcji dachowych.

- Wszystek używany sprzęt do rozbiórki powinien posiadać świadectwa, atesty zgodne z normami i przepisami prawa polskiego.

- Na budowie należy wydzielić miejsca na składowanie materiałów rozbiórkowych pokruszonych i elementów konstrukcyjnych

-Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy wraz z instruktorem BiHP przeprowadzi szkolenie pracowników w tym:

- określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych:

werbalnie, z potwierdzeniem na piśmie o odbytym szkoleniu

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom:

- zaopatrzenie kierownika budowy i majstra w sprawny telefon

projEKTANT arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna
arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

- umieszczenie na tablicy budowy i w innym widocznym ,ogólnodostępnym miejscu wykazu telefonów alarmowych (policja, pogotowie, straż pożarna, inspektor budowlany, inwestor)
- umieszczenie w widocznym, oznakowanym i łatwodostępnym miejscu apteczki
- przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- ogrodzenie, opisanie i oznakowanie placu budowy w sposób zapobiegający przypadkowemu, nieumyślnemu i niekontrolowanemu wtargnięciu na plac budowy osób nieupoważnionych, szczególnie dzieci
- składowanie narzędzi i maszyn w okresie przestoju jedynie w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach
- sprawdzanie sprawności urządzeń ( szczególnie elektrycznych) w przewidziany dla urządzenia sposób
- stały nadzór nad prawidłową organizacją placu budowy i prac budowlanych
- umieszczenie gaśnicy

**5. Wskazania innych zagrożeń i wymagań przy rozbiórce :**

**Prace na wysokościach:**

Prace na wysokości prowadzone z rusztowań i z żurawia budowlanego. Pracownicy wyposażeni w uprzęże zabezpieczające połączone z trawersami linowymi. Wygrodzenie obszaru przy rusztowaniach na odległość 2m od rusztowań. Pracownicy upoważnieni do prac na wysokości, posiadający odpowiednie badania lekarskie.

**Gazy techniczne.**

Jeżeli na budowie będą wykorzystywane gazy techniczne do cięcia lub spawania to butle będą ustawione w specjalnym wózku. Płomień palnika będzie osłonięty przesłoną. Spawacz winien pracować w wyposażeniu zgodnym z przepisami

**6. Sposób zabezpieczenia nieruchomości po dokonaniu rozbiórek:**

Po usunięciu budynku i ogrodzeń roboczych konieczne jest uporządkowanie terenu i jego wyrównanie w sposób niepowodujący niekontrolowanego osiadania gruntu i gromadzenia wód opadowych

projEKTANT arch.arch. katarasińska & nowak spółka cywilna
arch. arch. Ewa Katarasińska, Anna Nowak
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSŁUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12 Regon 590126480 Rach. bank. PEKAO S.A. o/P-ków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl, projektant-pt@neostrada.pl,

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Podstawy Prawne:

- Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.98.21.94)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych (Dz.U.00.40.470)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia... (Dz.U.02.151.1256)
- Rozporządzenie M.B. i P.M.B. z 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.72.13.93)

**Uwagi:**
**Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać PLAN BIOZ zawierający szczegółowe informacje związane z organizacją prac oraz BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami !!!**

EWA KATARASIŃSKA
Architekt
upr. proj. UAN IV.7342/53/91
w spec. arch. bez ograniczeń
ŁOIA LO 0100

# MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

Skala 1:1000

woj. łódzkie
pow. piotrkowski
gm. MOSZCZENICA
obr. MOSZCZENICA

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

BUDYNEK ROZEBRANY

HALA ROZEBRANA

GRANICE NIERUCHOMOŚCI

1 BUDYNKI DO ROZBIÓRKI

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosta Powiatu Piotrkowskiego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kopia materiału zasobu
nazwa materiału zasobu
122.442.241
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
2015-04-21
data wykonania kopii
z up. STAROSTY
Lucyna Stańczyk
PODINSPEKTOR

| | |
|---|---|
| projektant: | mgr inż.arch. Ewa Katarasińska |
| uprawnienia: | UAN.IV.7342/53/91 w spec. arch. bez ograniczeń |
| inwestor: | Gmina Moszczenica, ul.Kosowska 1<br>97-310 Moszczenica |
| data: | 04.2015 |
| skala: | 1:1000 |
| | RYS.NR 1 |

PROJEKT ROZBIÓREK BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH
PO BYŁYCH ZAKŁADACH BAWEŁNIANYCH W MOSZCZENICY
UL DWORCOWA dz. nr 640/25 i 640/38 gm.MOSZCZENICA

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7
97-300 Piotrków Trybunalski

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok. 6 m
STROP ŻELBETOWY - KOLEBKA
POKRYCIE - PAPA

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.3 m
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

ŚCIANY MUROWANE, WYSKOŚCI ok. 3 m
BEZ DACHU

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.3 m
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.3 m
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY DWUKONDYGNACYJNY
PODPIWNICZONY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.3 m
STROPODACH, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.3 m
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYS. KONDYGNACJI ok.6 m, DACH SZEDOWY,
CZĘŚCIWO ZAWALONYKRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY DWUKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.3 m
STROPODACH, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.5 m
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY DWUKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok. 3 m
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

ŚCIANA MUROWANA, WYS. OK. 5 m

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYS. KONDYGNACJI ok.5 m
DACH - WIĄZARY STALOWE, KRYTY BLACHĄ

BUDYNEK JEDNOKONDYG. Z WYBUDÓWKAMI
ŚCIANY MUROWANE
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYS. KONDYGNACJI ok.6 m, DACH DREWNIANY
CZĘŚCIOWO ZAWALONY

BUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
ELEWACJA - BLACHA
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

KOMIN MUROWANY
WYSOKOŚĆ ok. 48 m


BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY
ŚCIANY MUROWANE
ELEWACJA - BLACHA
DACH - WIĄZARY STALOWE, KRYTY BLACHĄ

BUDYNEK MUROWANY TRZYKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ BUDYNKU ok. 12 m
STROPY ŻELBETOWE
POKRYCIE - DACHÓWKA

BUDYNEK MUROWANY DWUKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.3 m
STROPODACH, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI ok.3 m
DACH DREWNIANY, KRYTY PAPĄ

BUDYNEK MUROWANY JEDNOKONDYGNACYJNY
WYS. KONDYGNACJI ok.6 m, DACH SZEDOWY,
CZĘŚCIWO ZAWALONYKRYTY PAPĄ

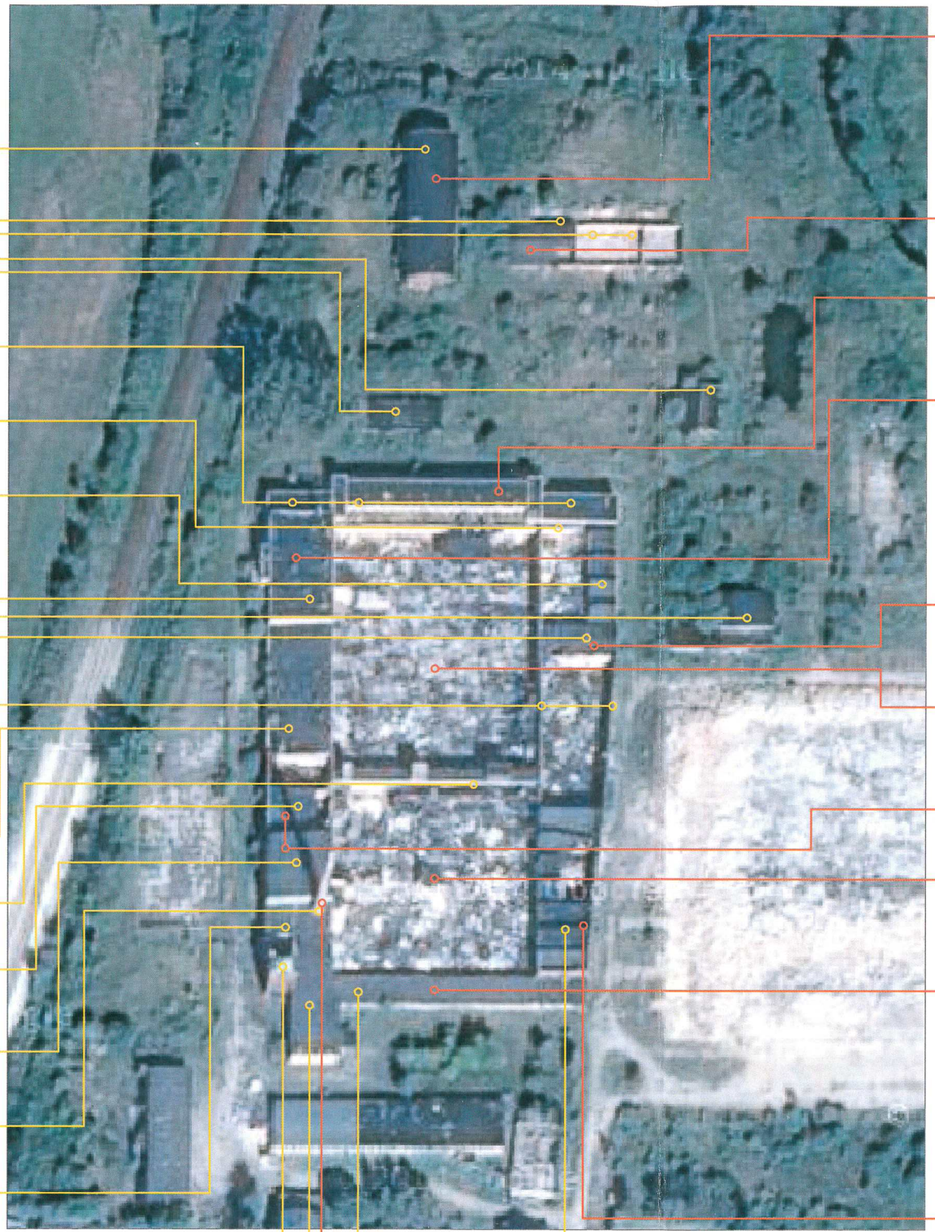
















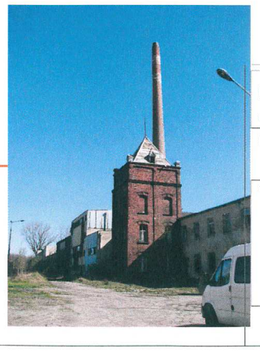













projektant
arch.arch.
katarasinska & nowak
spółka cywilna

projektant: mgr inż.arch. Ewa Katarasińska
uprawnienia: UAN.IV.7342/53/91 w spec. arch. bez ograniczeń

inwestor: Gmina Moszczenica, ul.Kosowska 1
97-310 Moszczenica

data: 04.2015
skala: b/s

RYS.NR 2

temat:

# PROJEKT ROZBIÓREK BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH PO BYŁYCH ZAKŁADACH BAWEŁNIANYCH W MOSZCZENICY

UL DWORCOWA dz. nr 640/25 i 640/38 gm.MOSZCZENICA

## OPIS BUDYNKÓW
